IT-PLATTFORMMIGRATION VON 43 BANKEN

in time / on budget / on quality

2. NOVEMBER 2012 – THOMAS SPAHR

Entris
Banking

AGENDA

1. Entris Banking
2. Programm Trivium
   - Facts & Figures
   - Struktur
   - Kef's / Beispiele
3. Konklusion / Summary

Trivium
Veränderung, die bewegt

TEIL EINER STARKEN FAMILIE

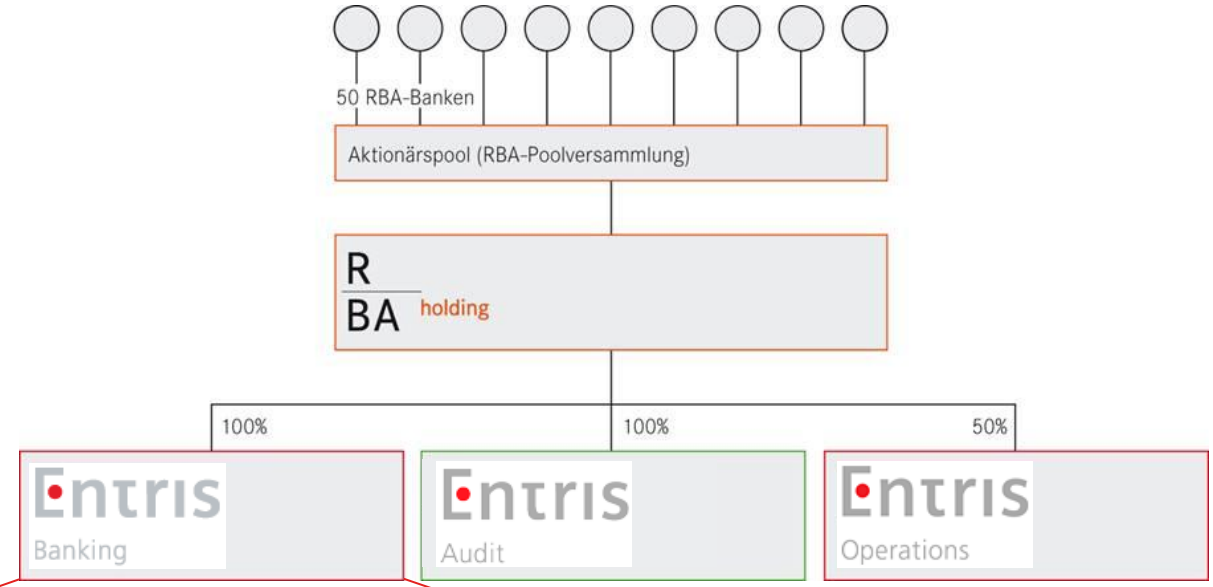

Zentral-/Girobank

Integrator

Standort Gümligen

aktuell 352 Mitarbeiter

MEHRWERT DURCH «ASSEMBLING». KOMPLEXITÄT WIRD EINFACH DURCH INTEGRATION.

Entris Banking als Integrator

Aus Leistungs-komponenten...

...erstellt Entris Banking Angebote: bedarfsgerechte Dienstleistungen und Produkte,…

...die Grundlage der Leistungserbringung und der Produkte von Banken sind,...

...die dem Bedarf der Bankkunden entsprechen und gekauft werden.

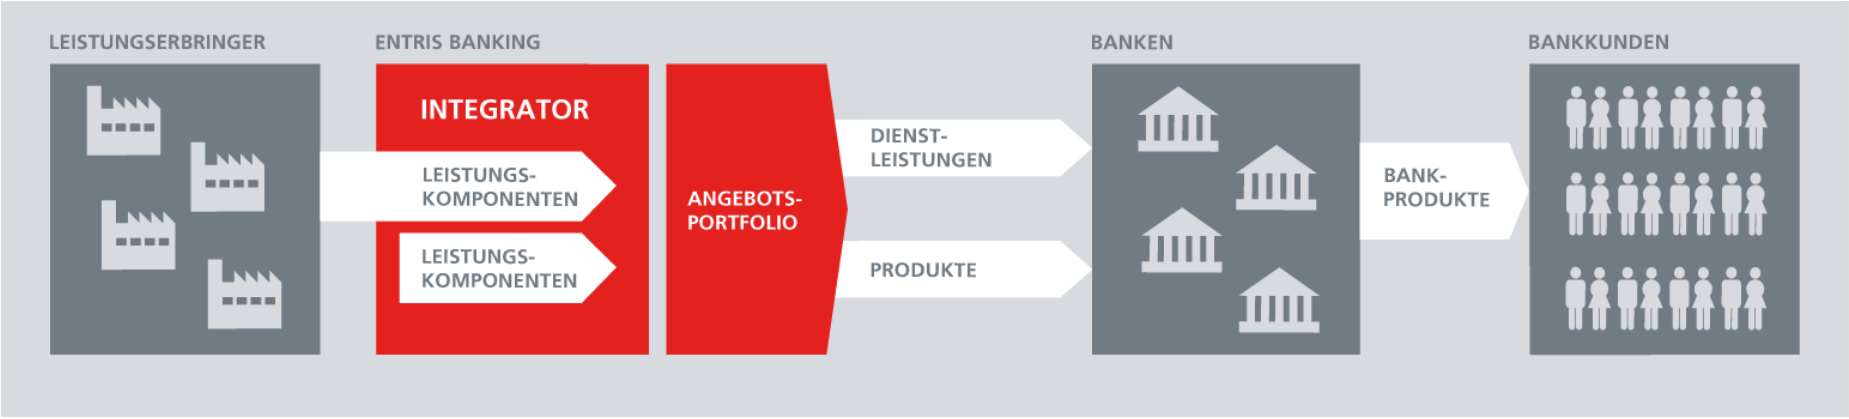

ENTRIS BANKING.
FACTS & FIGURES AUF EINEN BLICK.

Entris Banking bietet IT Outsourcing (ITO) und Business Process Outsourcing (BPO) für Schweizer Finanzinstitute.

- Das Angebotsportfolio von Entris Banking ist umfassend:
- Auf der Business-Plattform lassen Banken ihr Geschäft in den Bereichen Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen, Finanzieren verarbeiten.
- Ergänzende Leistungen decken die Themen Legal, Compliance, Risiko-Management, HR ab
- Entris Banking verfügt über eine Banklizenz und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Entris Banking ist eine Tochtergesellschaft der RBA-Holding.

- Die RBA-Holding ist ein Zusammenschluss Schweizer Regionalbanken.
- Zur RBA-Holding gehören neben der Entris Banking AG auch die Entris Audit AG sowie die Entris Operations AG (Joint-Venture mit BEKB│BECB)
- Entris Banking besteht als operative Tochtergesellschaft der RBA-Holding seit zehn Jahren und ist Arbeitgeber für rund 300 Vollzeitstellen.
- Zu den Kunden der Entris-Gesellschaften gehören neben den RBA-Banken weitere Schweizer Regional- und Privatbanken.

AGENDA

1. Entris Banking
2. Programm Trivium
   - Facts & Figures
   - Struktur
   - Kef's / Beispiele
3. Konklusion / Summary

Trivium
Veränderung, die bewegt

AUSGANGSLAGE PROGRAMM TRIVIUM

- Rund 50 Banken sowie RBA-Gesellschaften mit über 4'000 Anwendern stehen gemeinsam vor dem Wechsel der IT-Plattform von RTC/IBIS auf Finnova.
- Entris Banking führte das Gesamtprojekt im Auftrag der Banken zusammen mit dem Migrationspartner Swisscom IT-Services Finance.
- Die Migration soll vom Jahreswechsel 2010/2011 bis Mai 2012 dauern.
- Für die Projektaktivitäten werden 50'000 bis 60'000 Personentage veranschlagt.
- Trivium ist wohl das grösste je realisierte Migrationsprojekt in der Schweiz.

DIE PROJEKTPLANUNG TRIVIUM

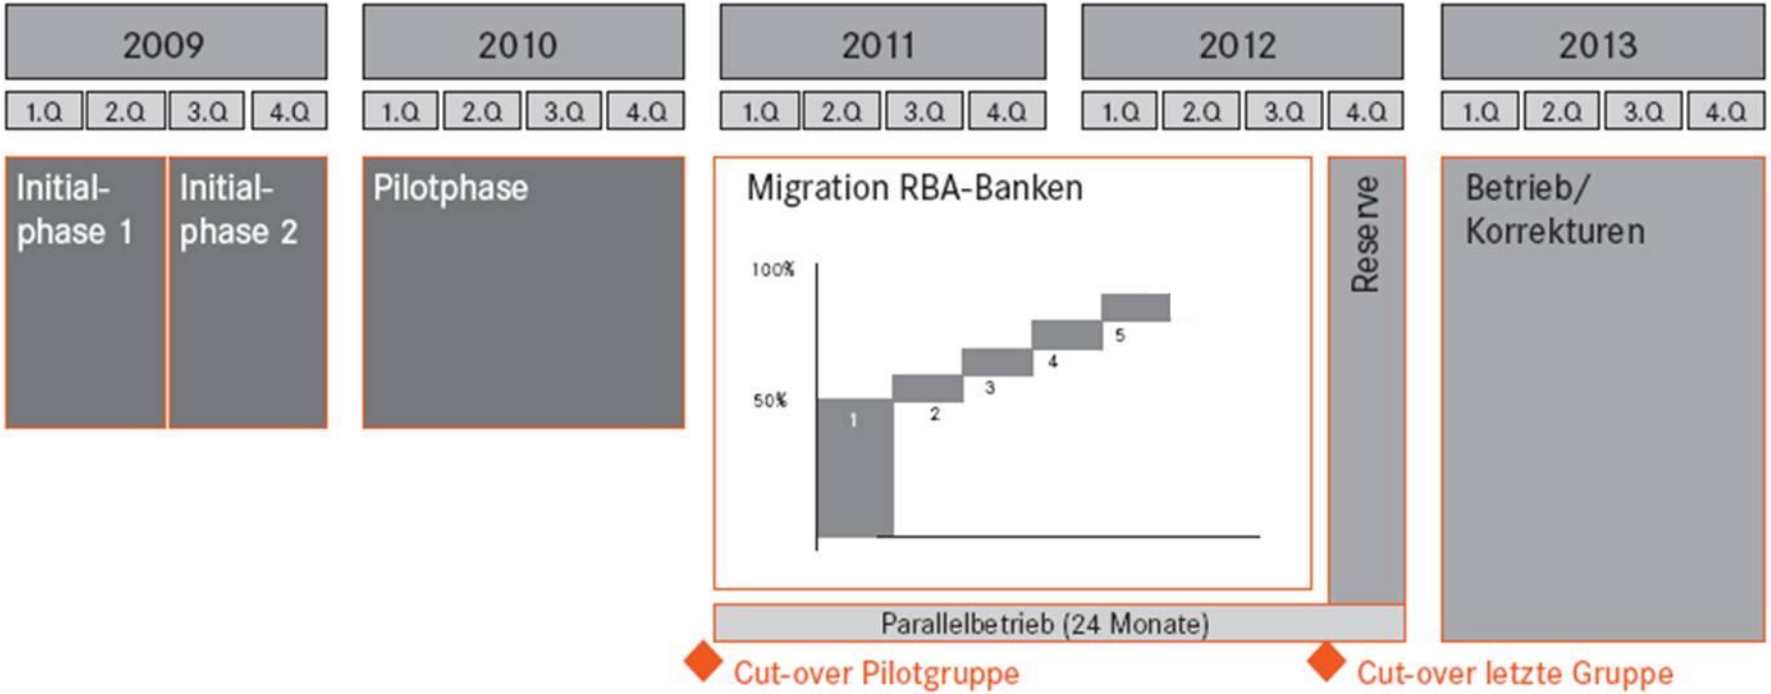

Gruppe 1	=	3 Banken, 4 Gesellschaften	2'300 Anwender
Gruppe 2	=	4 Banken	+100 Anwender
Gruppe 3	=	10 Banken	+350 Anwender
Gruppe 4	=	14 Banken	+430 Anwender
Gruppe 5	=	12 Banken	+180 Anwender
TOTAL		**43 Banken, 4 Gesellschaften**	**3'360 Anwender**

GROBPLANUNG MIT MEILENSTEINEN

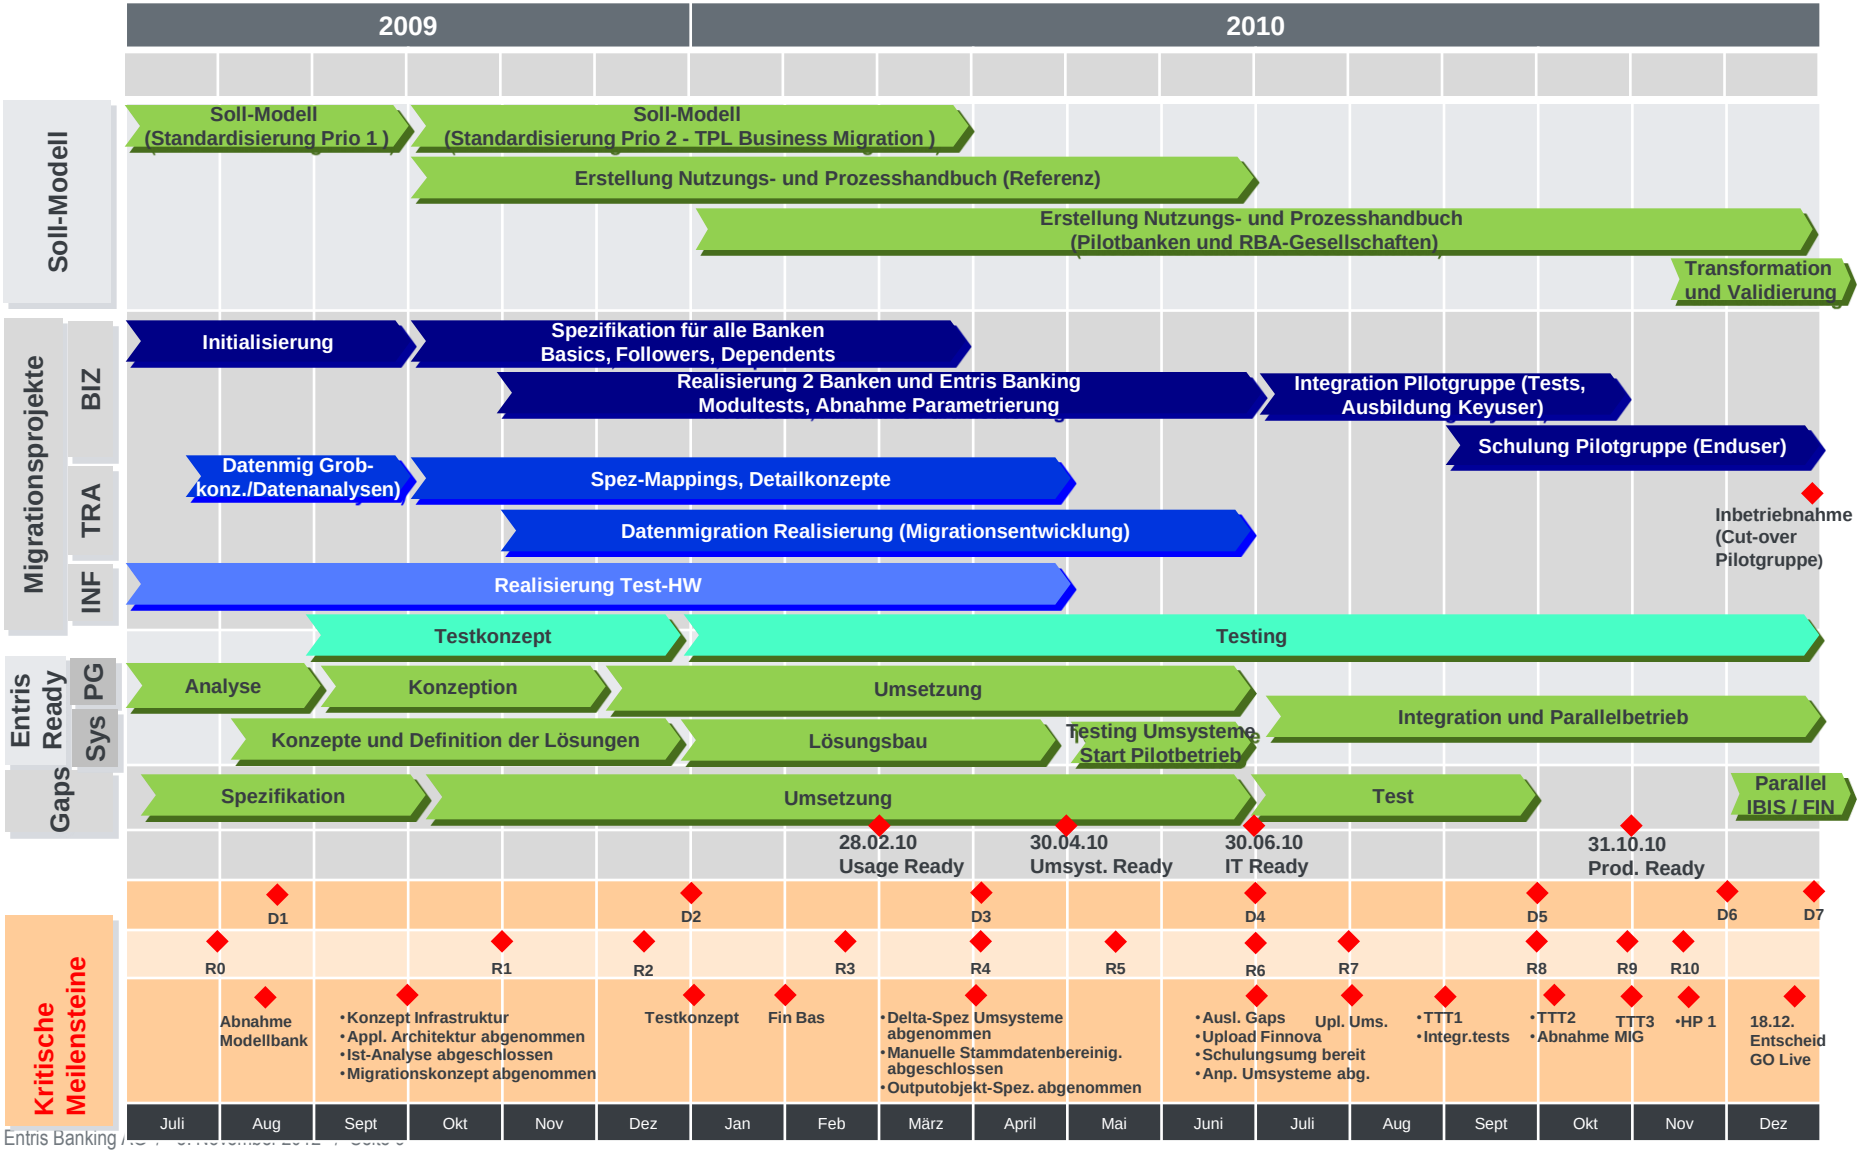

IT-META-PLANUNG 2012 – VERSION 1.4A
ECKWERTE

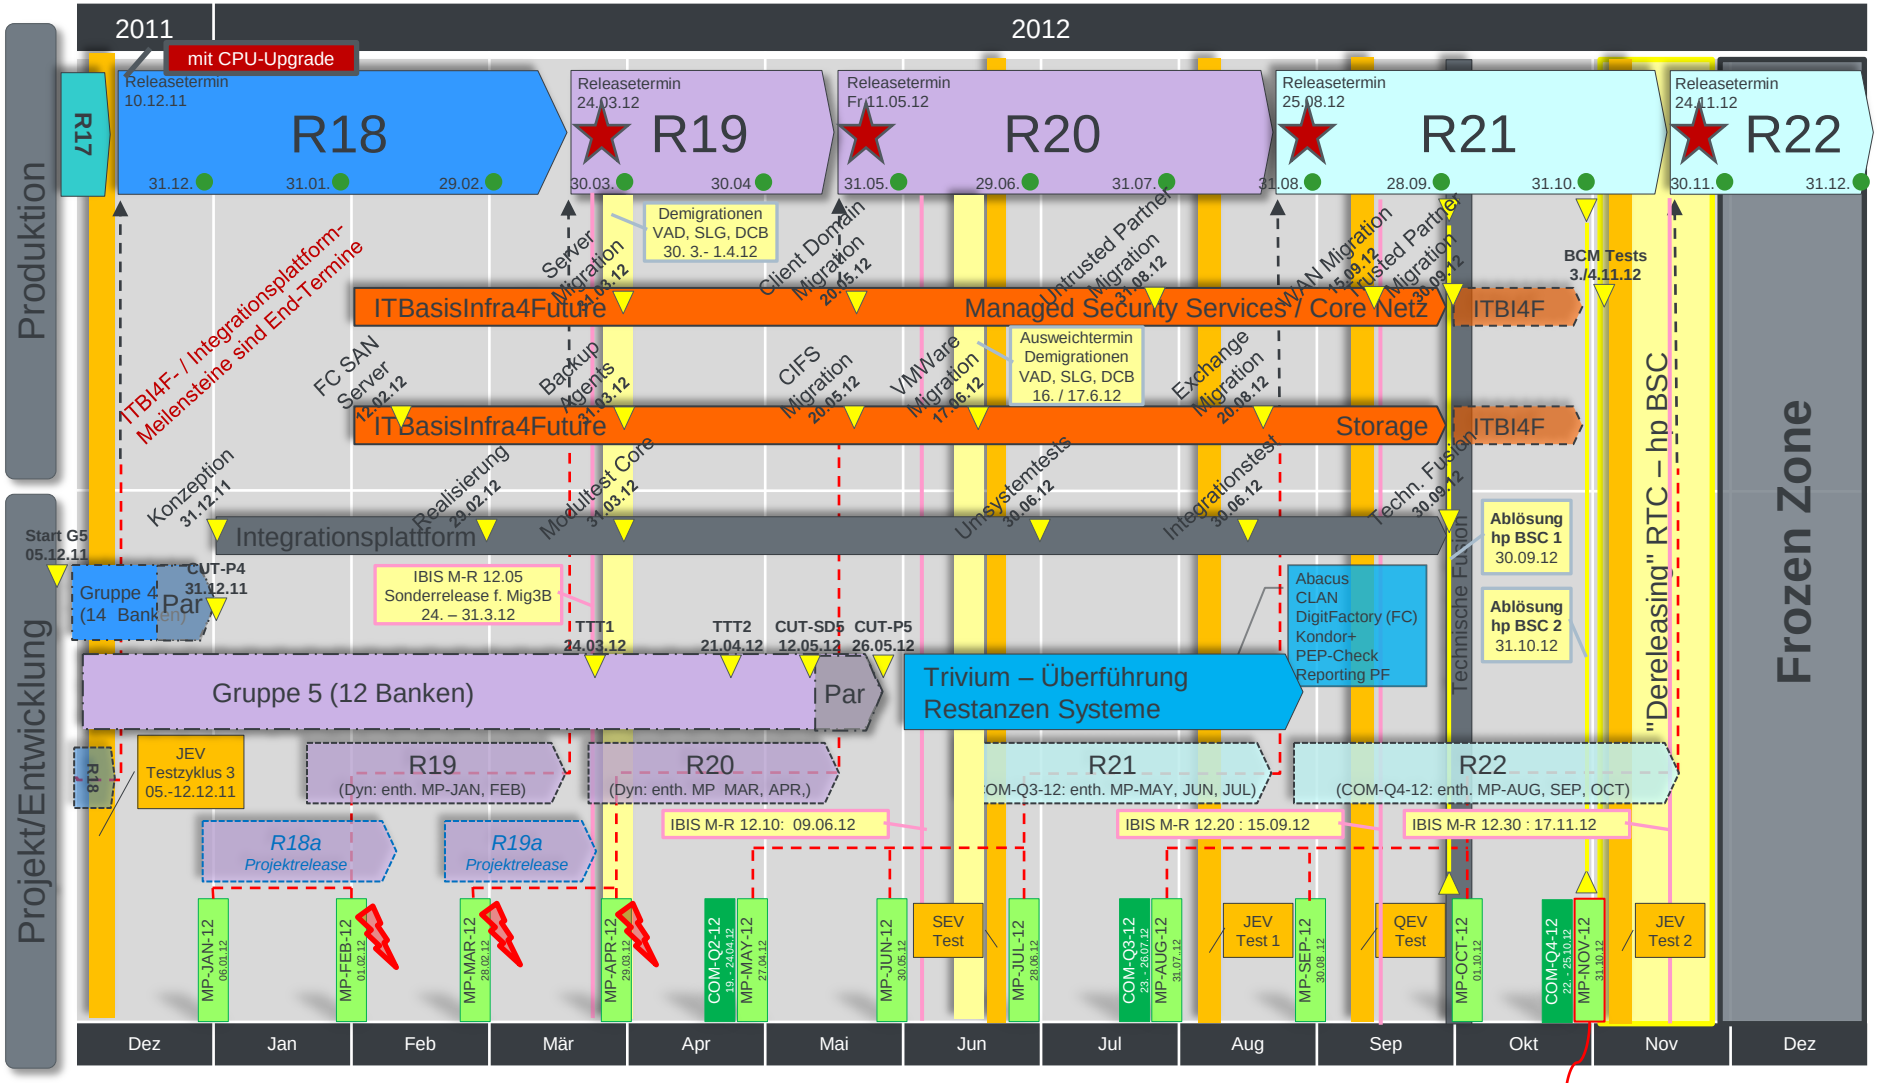

ORGANISATION

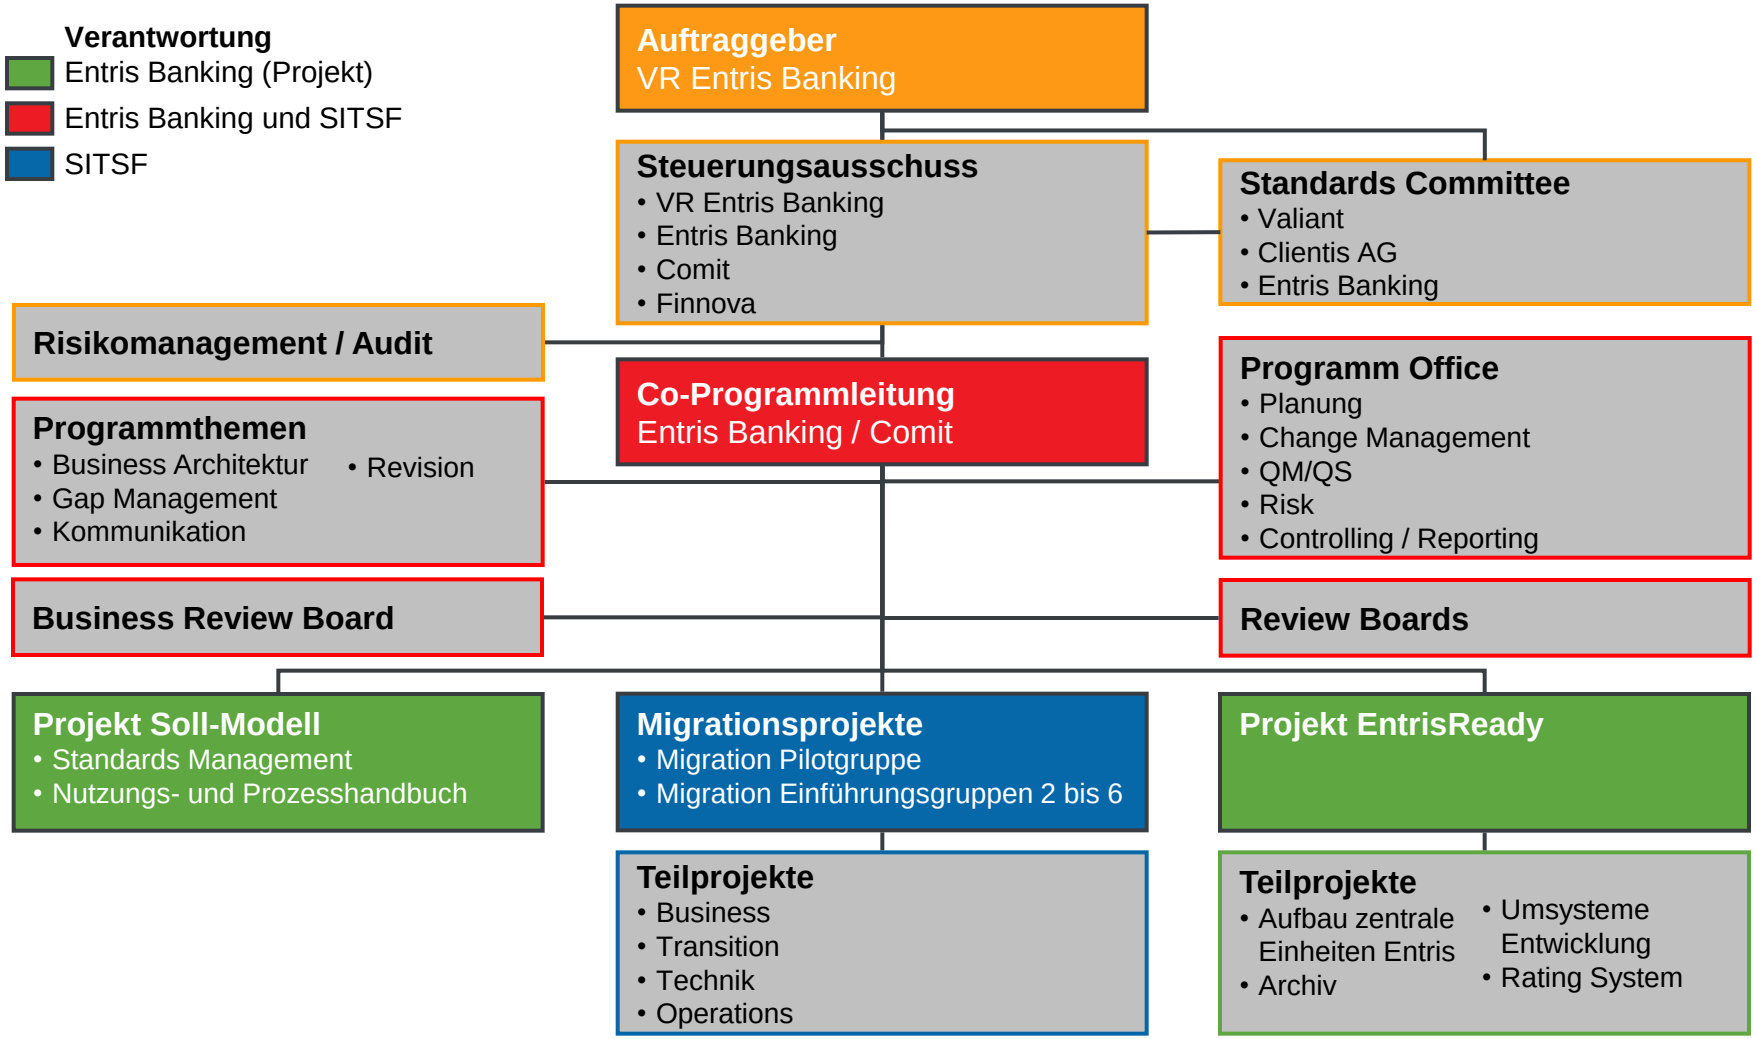

ELEMENTE DER PROJEKTORGANISATION MIGRATION

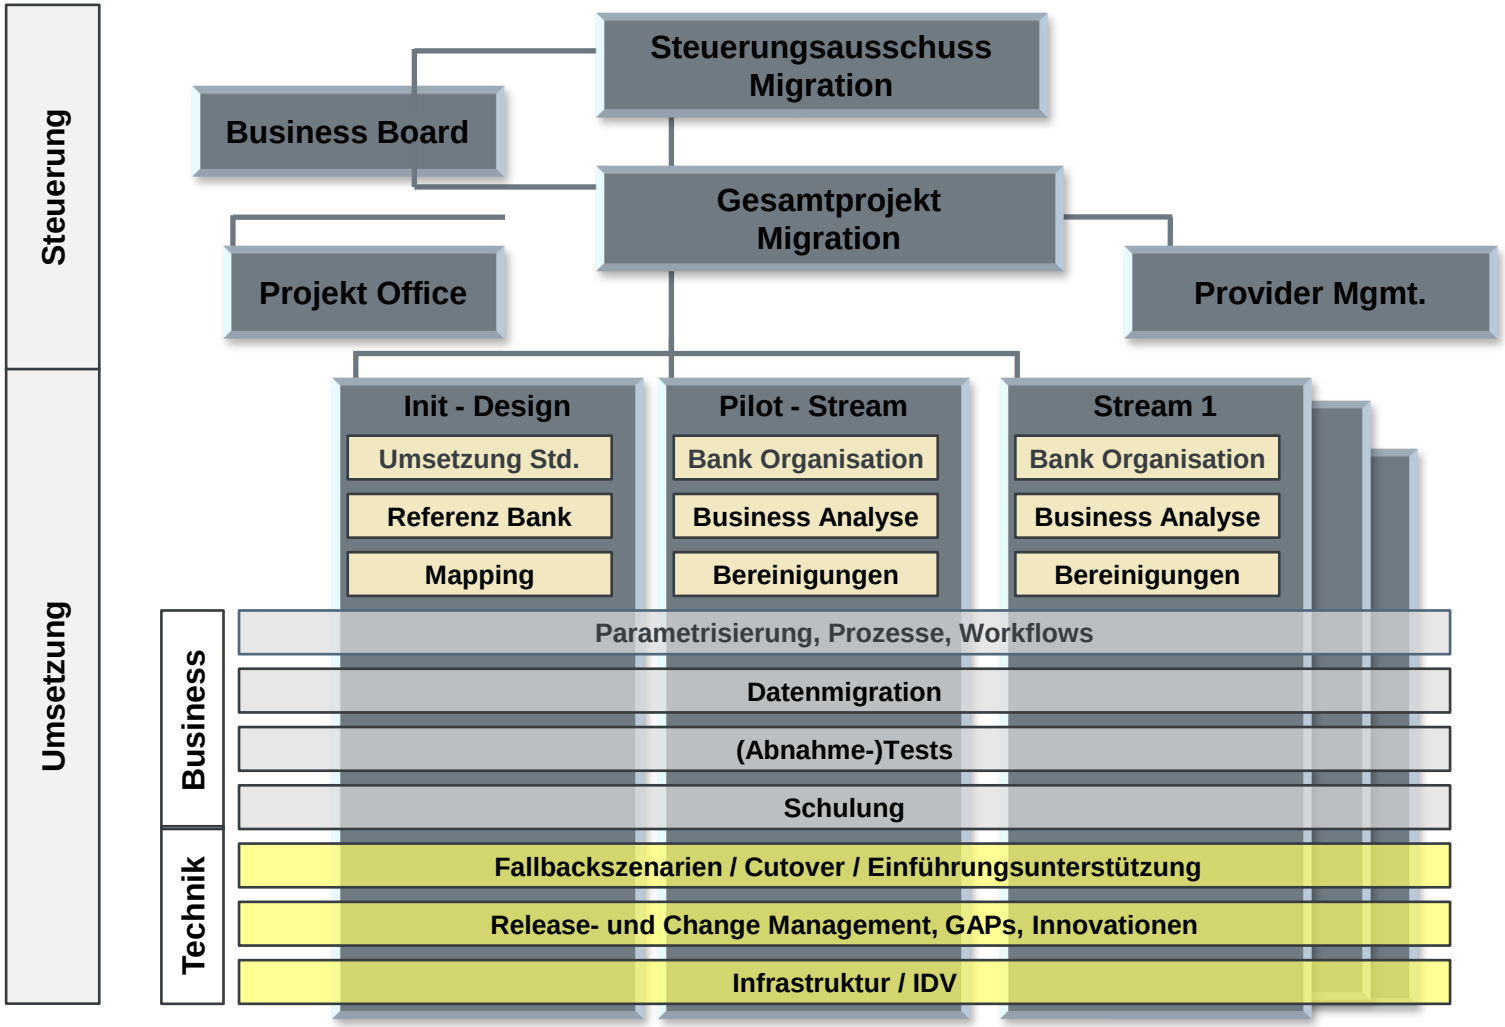

GESAMTORGANISATION AB 01.01.2011

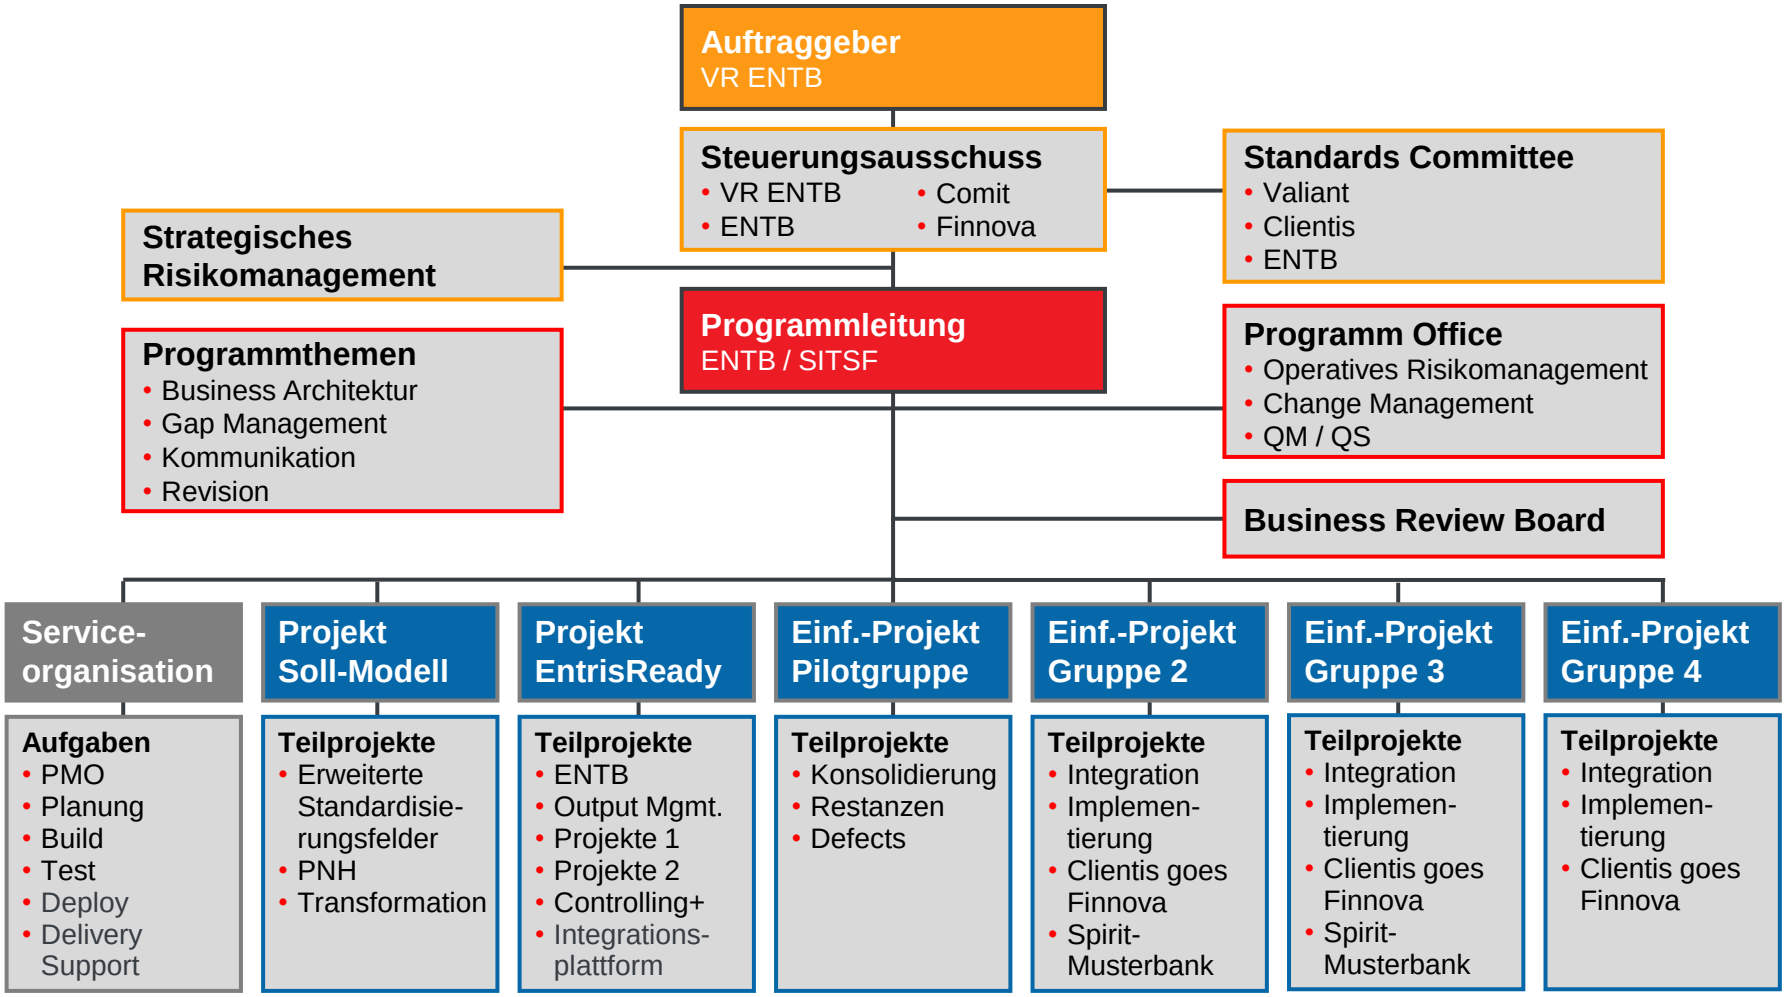

PRÄMISSEN TRIVIUM

- Eine **rasche, kosteneffiziente und terminlich wie qualitativ sichere Migration** der RBA-Gruppe ist zwingende "Over-all-Prämisse".
- **Das geschlossene und gemeinsame Vorgehen** in der RBA-Gruppe ist die Grundlage, um das Vorhaben zum Nutzen der Banken erfolgreich umzusetzen.
- Die **Standardisierung** ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und effiziente Nutzung von Finnova.
- Die **RBA-Referenzbank** ist der Bezugspunkt für die Implementierung und Pflege von RBA-Einzelbankinstallationen.
- Die **Automation** der Migration steigt im Programmverlauf rasch an.
- Die Banken kommen uneingeschränkt ihren **Mitwirkungspflichten** nach.

PROGRAMMGREMIEN

- Steuerungsausschuss
- Standards Committee
- Business Review Board
- Programm Management
- Projektsteuerung

- Change Advisory Board Finnova
- Release Management Meeting
- Release Control Board
- Architecture Change Advisory Board *

MEETINGSTRUKTUR 2011

	Montag	Dienstag	Mittwoch-B	Mittwoch-P	Donnerstag	Freitag
morgens	Release-Mgmt. Meeting Kernteam Service-Org.	Programm RCB	STL BUILD VOR ANL + PMS ENT ZAL	Soll-Modell		
nachmittags	PLAN		KuK A+B FIN	Kernteam EP2 Kernteam EP3	Kernteam ER	

STANDARDTRAKTANDEN PROGRAMM-MEETING

Info Programm
Betrieb
- Betriebliche Vorkommnisse Taskreporting
- ARGE Systemoptimierung
- Betriebsreporting

Projekte Stati
- Testing
- Status Finnova
- Status G4
- Status G5
- Status Serviceorganisation
- Status Applikation
- Status EntrisReady
- Soll-Modell

Spezialthemen
-
-

AGENDA

1. Entris Banking
2. Programm Trivium
   - Facts & Figures
   - Struktur
   - Kef's / Beispiele
3. Konklusion / Summary

Trivium
Veränderung, die bewegt

ERFOLGSFAKTOREN ÜBERSICHT

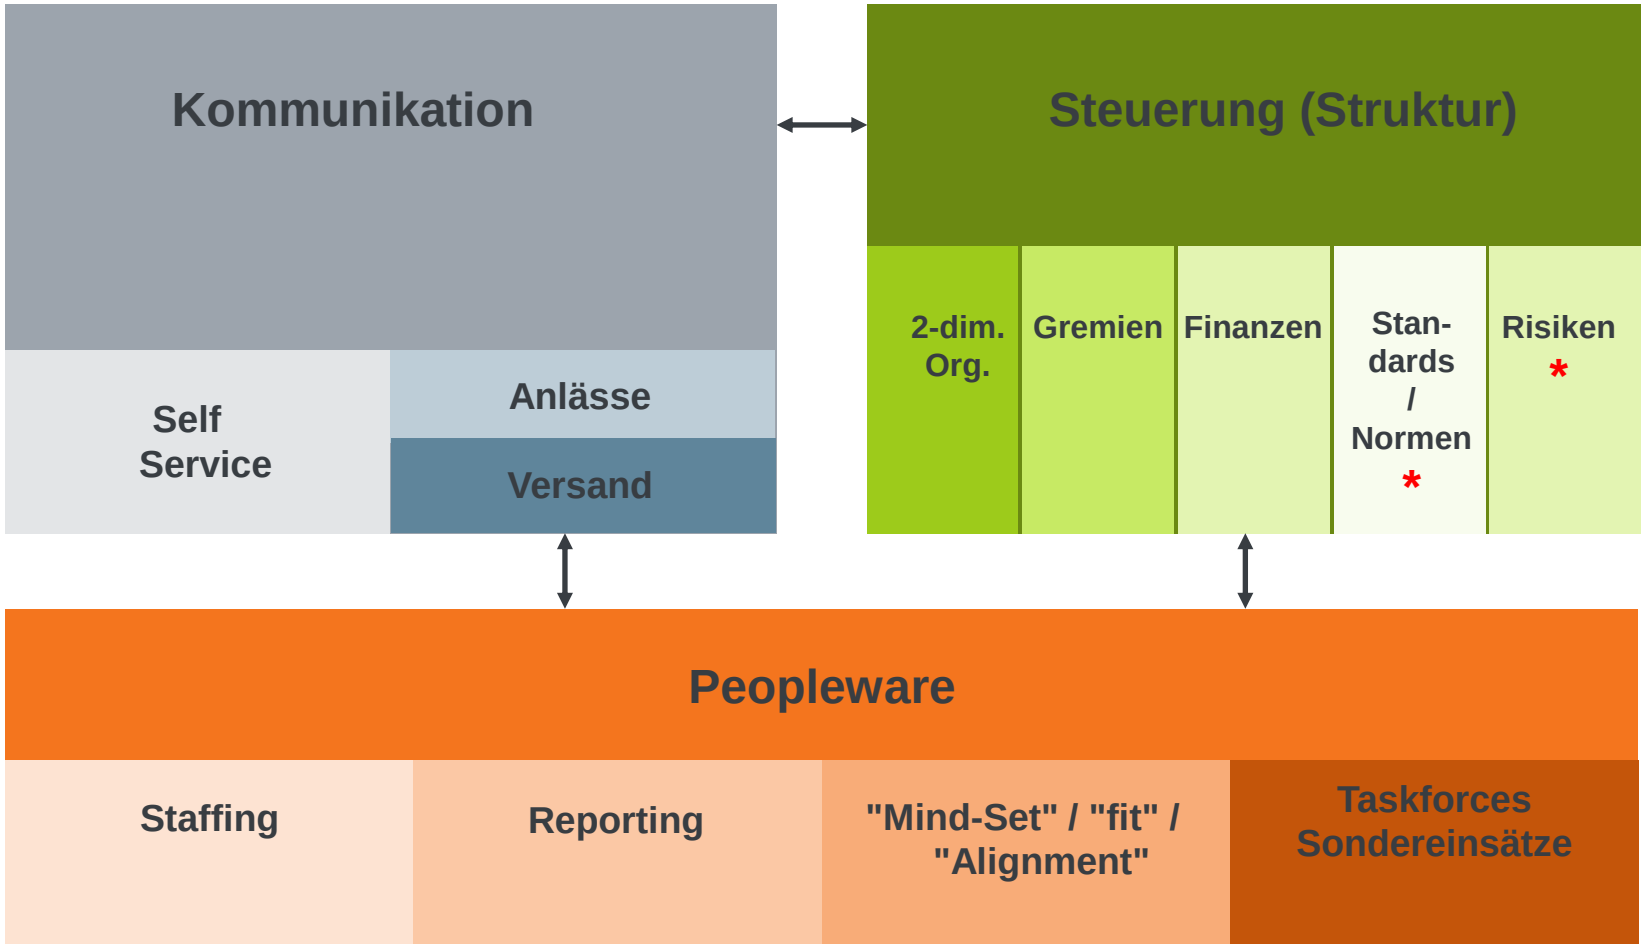

ERFOLGSFAKTOREN
STEUERUNG ORGANISATION GREMIEN

- **2-dimensionale Programmstruktur mit Sichten Streams, Teilgebieten und Einbindung aller Stakeholder (≠ Teilprojekte).**

Effizienz:	5
Effektivität:	5
Overhead ("Kosten"):	4
Fehlerrate:	5

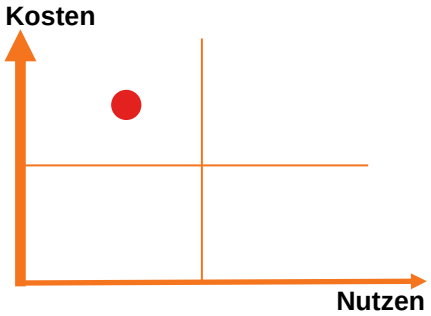

- **Isolierte Zusatzgremien (nebst der ordentlichen Projektstruktur):**
- **Finanzielle Steuerung**

Effizienz:	5
Effektivität:	6
Overhead ("Kosten"):	6
Fehlerrate:	5 (6)

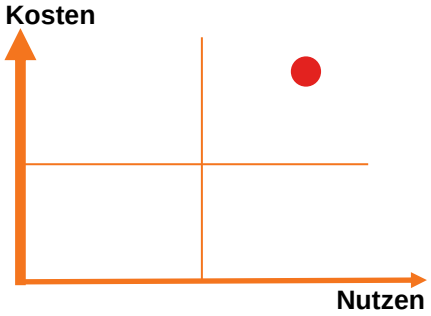

ERFOLGSFAKTOREN
RISIKEN / REPORTING

- **Unabhängiges Riskmanagement**

Effizienz:	5
Effektivität:	5
Overhead ("Kosten"):	6
Fehlerrate:	4



- **Standardisiertes Reporting**

Effizienz:	5
Effektivität:	6
Overhead ("Kosten"):	5
Fehlerrate:	5

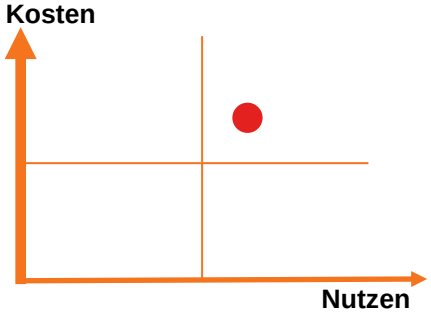

ERFOLGSFAKTOREN "PEOPLEWARE"

- Taskforces (bewusst eingesetzt), 1-dimensional
- Programmsteuerung auf Metaebene (kein zentrales Project Office)
- Breiter Infofluss im Kreis der Keyplayer und angemessene 7x24 Abstimmung "informell"
- Bei Bedarf und bei Gruppenabschlüssen wird (wurde) die Gesamtstruktur angepasst
- Bei Bedarf werden (wurden) Keypersonen rasch ersetzt
- Staffing nach marktlichen Lösungen (≠ nach hierarchischen Lösungen). Research-, Informations-, und Vertragskosten machen sich mehr als bezahlt.
- Einfluss und Macht (Kultur der Entscheide) primär abhängig von Wissen und können, sekundär von Rang / Funktion und Hierarchie.
- Involvement aller Stakeholder (mehrstufig) mit Intranetseite, Brown-Paper-Lunches und Plakaten, Publikationen, teilweise auch Feste / Anlässe (Mitarbeiterinfo mit Apéro und "Gift").

BEISPIEL INFORMATION TRIVIUMNET

Willkommen im Triviumnet, dem Informationsportal für das Projekt Trivium

Das Triviumnet ist die aktuelle und vollständige Informationsplattform für alle Projektmitarbeitenden und -betroffenen. Projektmitarbeitende finden verbindliche Arbeitspapiere, und die Banken können sich über den Projektstand orientieren.

Trivium
Veränderung, die bewegt

News

- 30.05.2012 - Erfolgreiche Einführung der Finnova Plattform für die Banken der Gruppe 5
- 23.04.2012 - Erfolgreicher TTT2 der Gruppe 5
- 26.03.2012 - Erfolgreicher erster TTT der Gruppe 5
- 30.01.2012 - News aus dem Bankensoftware-Umfeld: Die Zeit ist reif für BPO in der Finanzbranche
- 09.01.2012 - Erfolgreicher Betriebsstart der 14 neuen Banken auf der Business Plattform
- 05.01.2012 - Trivium-Newsletter Nr. 19 / Newsletter Trivium no 19
- 03.01.2012 - "Go" für den Finnova-Betrieb der Banken der Gruppe 4!
- 07.12.2011 - Trivium-Newsletter Nr. 18 / Newsletter Trivium no 18
- 05.12.2011 - Erfolgreicher TTT2 der Gruppe 4
- 11.11.2011 - Schlussbericht Soll-Modell 4.2

Letzte 30 Tage | Archiv 2012 | Archiv 2011

Service-Einschränkungen Umgebungen Trivium

Status	Datum	Inhalt

Archiv

Neuste Inhalte

Übersicht neuste Dokumente

10.01.2012 - Releaseraster 2012, V1.4
IT-Meta-Planung (Eckwerte)

11.11.2011 - Schlussbericht Soll-Modell V4.2

05.07.2011 - Planung 2011, V1.1
Übersicht zur IT-Meta-Jahresplanung 2011

05.07.2011 - Releaseraster 2011, V1.7
Planungsvorgaben für Projekt und Betrieb

03.05.2011 - Betriebs- und Projektprozesse
Präsentation vom 28.04.2011

07.02.2011 - Rapportierung im Projekto
Regelung für Serviceorganisation und Gruppe 2

02.02.2011 - Serviceorganisation 2011
Kickoff Serviceorganisation 2011

25.01.2011 - Trivium-Organisation ab 2011
Programm Trivium, Serviceorganisation, Einführungsprojekte

14.01.2011 - Projekt EntrisReady
Planung, Themen und Organisation 2011

12.12.2010 - Zusammenspiel Betrieb - Trivium 2011
Folienpräsentaiton aus Mitarbeiterinformation

11.11.2010 - Soll-Modell V4.1
Schlussbericht

22.10.2010 - Leistungsmodell Entris Banking
Informationsdossier für Banken

Direkt zu

- Service Desk-Portal
- Übersicht: Informationen zu Handen der RBA-Banken
- Übersicht: Folienpräsentationen
- Masterplan Migrationsgruppen / weitere Planungen
- Prozess- und Nutzungshandbuch
- Lieferergebnisse
- Who is who?
- Fragen & Antworten
- Glossar
- Zugriff aufs Triviumnet

Count-down

Seit 154 Tagen
ist die Gruppe 5
auf Finnova!

BEISPIEL INFO NEWSLETTER

Trivium
Veränderung, die bewegt

Trivium-Newsletter Nr. 10 – November 2010
Sonderausgabe Vorschau auf den TTT4

Geschätzte Leserin
Geschätzter Leser

Der Test- und Trainings-Tag vom 13. November 2010 ist wegen technischer Probleme nicht für alle Beteiligten gleich gut verlaufen. Einige Anwender konnten das System nutzen, andere konnten wegen Zugriffs- und Performanceproblemen nur wenige Geschäftsfälle abwickeln. Die Trainingschance konnte somit nicht im geplanten Ausmass genutzt werden.

Dass das Ergebnis des TTT3 wegen der System- und Netzwerkprobleme in der allgemeinen Wahrnehmung unbefriedigend ausgefallen ist, bedauern die involvierten Verantwortungsträger aller Parteien sehr. Es tut uns leid, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht wie gewünscht arbeiten und trainieren konnten und dies trotz sorgfältiger Vorbereitungen. Nichts desto trotz konnten aber auch aus diesem TTT wieder wichtige Erkenntnisse gewonnen und die nötigen Anpassungen initiiert und teilweise bereits umgesetzt werden.

Aus oben genannten Gründen haben die Programm- und Bankleitungen beschlossen, einen weiteren Test- und Trainings-Tag in einer Sequenz durchzuführen. Mit dem TTT4 vom 24. – 27. November 2010 wollen wir sicherstellen und auch beweisen, dass die Systeme performant und stabil sind. Gleichzeitig sollen die Anwender mehr Sicherheit im Umgang mit Finnova erhalten. Informieren Sie sich anhand unserer Newsletter-Sondernummer über den TTT4.

Für ihren ausserordentlichen Einsatz und ihr Engagement danken wir allen Beteiligten bestens!

René Kohler, Programmleiter Trivium
Hans-Peter Fuchser, Geschäftsleitung Entris Banking

Trivium-Uhr

Die Ecktermine:

• Start Umsetzung	01.07.2009
• Stand aktuell	23.11.2010
• Cut-over Pilotgruppe	01.01.2011
• Cut-over letzte Gruppe	01.09.2012



BEISPIEL INFO / STAKEHOLDERMANAGEMENT MEDIENSPIEGEL

Medienspiegel zum Cut-over der Pilotgruppe

Die Valiant Holding, die Clientis AG sowie Entris Banking zusammen mit Comit und Finnova haben am 6. Januar 2011 die Medien über die Migration der Pilotgruppe informiert bzw. Medienmitteilungen auf ihren Internetseiten aufgeschaltet. Hier ein Ausschnitt aus den Online-Medien. Den vollständigen Medienspiegel finden Sie im Triviumnet, Rubrik News.

BEISPIEL STEUERUNG REPORTING

Wochenbericht Woche 36
Umstellung PFB-SST XML

Trivium
Veränderung, die bewegt

Lead, Beteiligte	Ausgangslage, Problembeschreibung	Status / Tendenz
- ENTB: A. Wyss (Lead, Ferien), Stefan Neuenschwander (aktueller Lead), Javier Verdes - Swisscom: Evelyn Büecheler, Linus Valaulta - VAB: Thomas Straub, Thomas Gempeler - CLI: Ingo Perler	- **Projektgewichtung bei ENTB "zu schwach" gegenüber Wichtigkeit auf Bankseite (wichtigstes Refinanzierungsinstrument).** - **Engpass v.a. bei ENTRIS (nur 2 Personen) und Swisscom** - Trivium ist am abschliessen, die Restanz Pfandbriefbank kann vorerst nicht geschlossen werden. - Das Projekt hat immer und immer wieder Verzögerungen und neue Komplexitäten - Massentests VAB von Woche 35 ergeben ernüchterndes Bild, nur ca. 40% des Deckungswertes werden mit den angemeldeten Objekte erreicht. Viele Objekte sind entweder nicht bereinigt oder fallen bei der Anmeldung wieder in die Ausschlusskriterien - →Problemanalyse und Aufgleisung Nachbereinigung im Gang - → Skepsis bei PFB, ob Ziel bis 13./14.10 (bis zur Umstellung) erreicht werden kann	

Aktueller Stand	Nächste Schritte
▪3. Tranche Mehrfamilienhäuser bei VAB lanciert. ▪Finnova-SW oft (zu oft) fehlerhaft, es gibt auch viele offene Punkte, die ungelöst sind (z.B. Gebäudeversicherung Kanton Aargau, Basiswert/Basisjahr, Nutzungsart "Eigennutzung" etc.) ▪ Das Primärziel going life mit der fusionierten Valiant per Mitte Oktober bleibt. ▪ Aufgrund der erneuten Fachtests und dem schlechten Bereinigungsstand Gruppe 2/3 werden diese nach hinten geschoben → Replanning im Gang mit Stakeholder ▪ **Gesamtstatus sehr kritisch!** **→Priorität des Projekts muss erhöht werden, am kritischsten ist VAB wegen Volumen und wegen Fusion 30.09.2012.** **→Allfällige unterstützende Massnahmen müssen getroffen werden → mit VAB muss eine TF-Gruppe für Bereinigung organisiert werden.**	• ab 19.09.2012: Retest Abnahmetests VAB gekürzt (d.h. nicht mehr das ganze Testkonzept wird durchgespielt) • ab 2.10.2012: erneuter Massentest VAB •Ab sofort: Bereinigung MFH bei VAB •Bis Ende Woche 37 Nachbereinigung lancieren bei VAB

AGENDA

1. Entris Banking
2. Programm Trivium
   - Facts & Figures
   - Struktur
   - Kef's / Beispiele
3. Konklusion / Summary

Trivium
Veränderung, die bewegt

KONKLUSION (+) ☺

- **Genügend Zeit und Engagement in der Init-Phase aufgewendet. "How to crack the case"!**
- **Hard Facts**
  - 50% des Erfolgs beruhen auf guter / angepasster **Organisation**.
    Hinweis: Organisation ist immer Aufbau- und Ablauforg.
  - 25% des Erfolgs beruhen auf möglichst optimalen **Staffing** (Fachkompetenz – Methodenkompetenz – Sozialkompetenz)!
  - 25% des Erfolgs beruhen auf **faktenbasierter Argumentation.** *
- **Soft Facts**
  - 50% des Erfolgs beruhen auf dem **Alignment der (aller) Keyplayer**. *
  - 30% des Erfolgs beruhen auf der Kommunikation! *
  - 20% des Erfolgs beruhen auf gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz (1:1).

KONKLUSION (-) ☹

- Zusatzkosten / Zusatzlast der Taskforces
- Gefahr der fulltime Informationsverabeitung
- Gefahr der zu rudimentären Gesamtplanung (Mutter aller Meilensteine)
- Gefahr der Personenabhängigkeit von den 5 – 7 absoluten Keyplayern
- Gefahr von Fehlern
- Problem der Zusatzlast (Abende / Wochenenden)

ERFOLGSFAKTOREN ÜBERSICHT

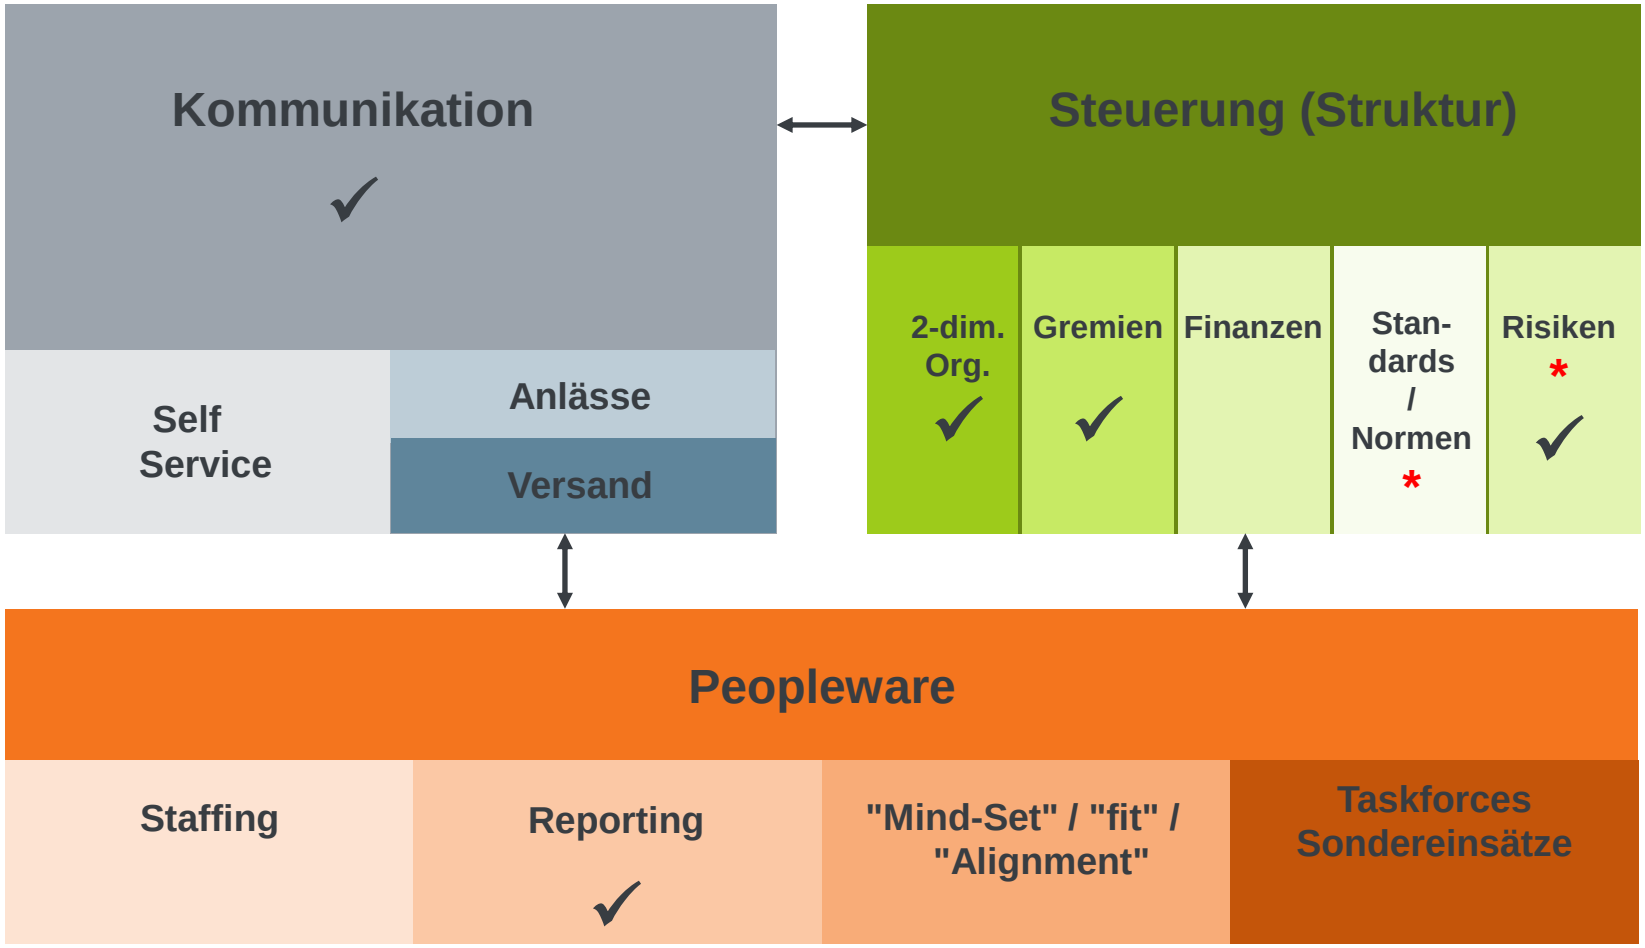

KONKLUSION MATURITÄT

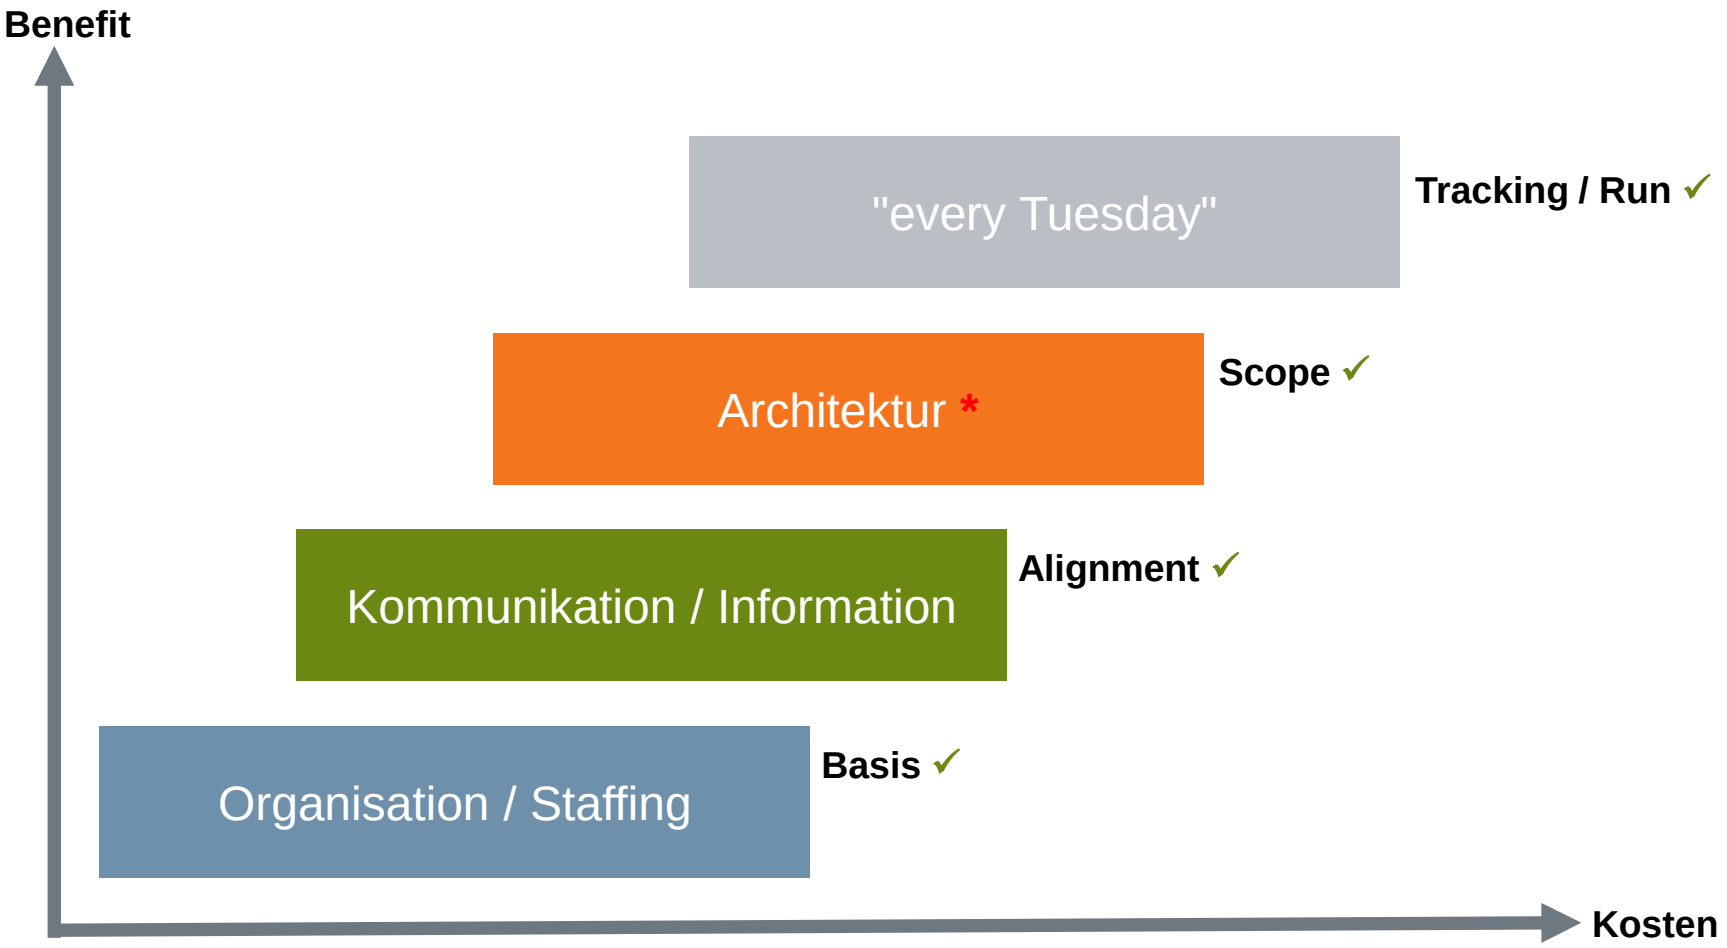

KOMPLEXITÄT

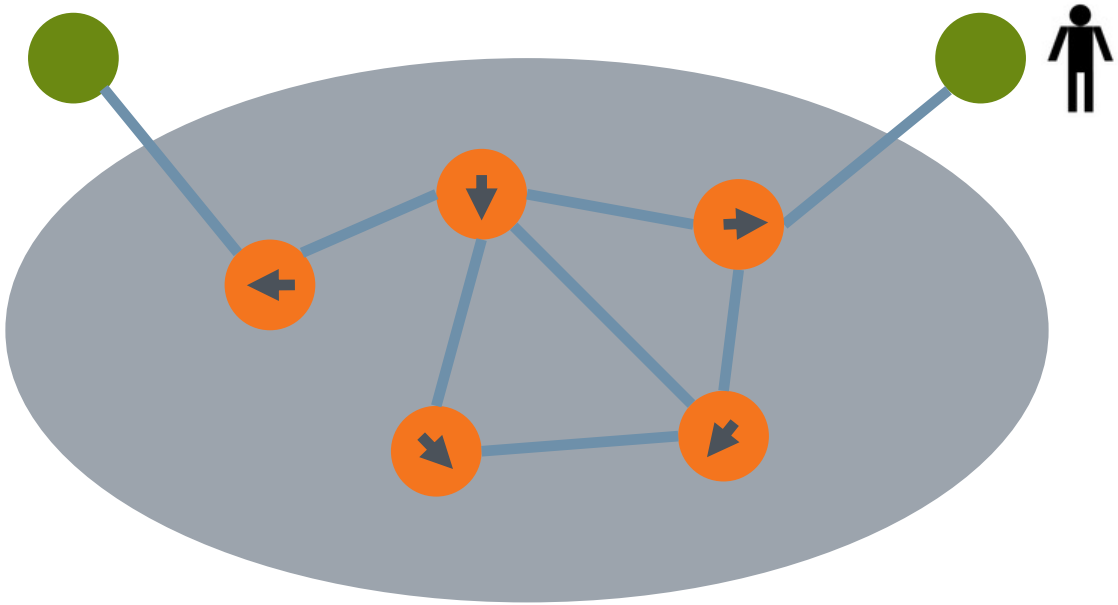

Komplexität eines (unseres) Systems = (ne x nb + fre) x a

= e

= re

= b

= a

SUMMARY SICHT ARCHITEKTUR (DIE SACHEBENE)

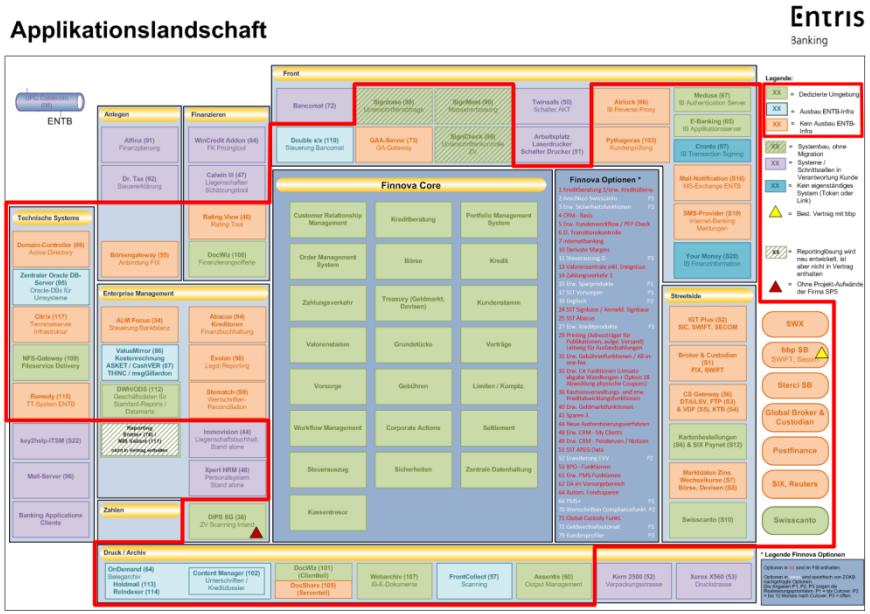

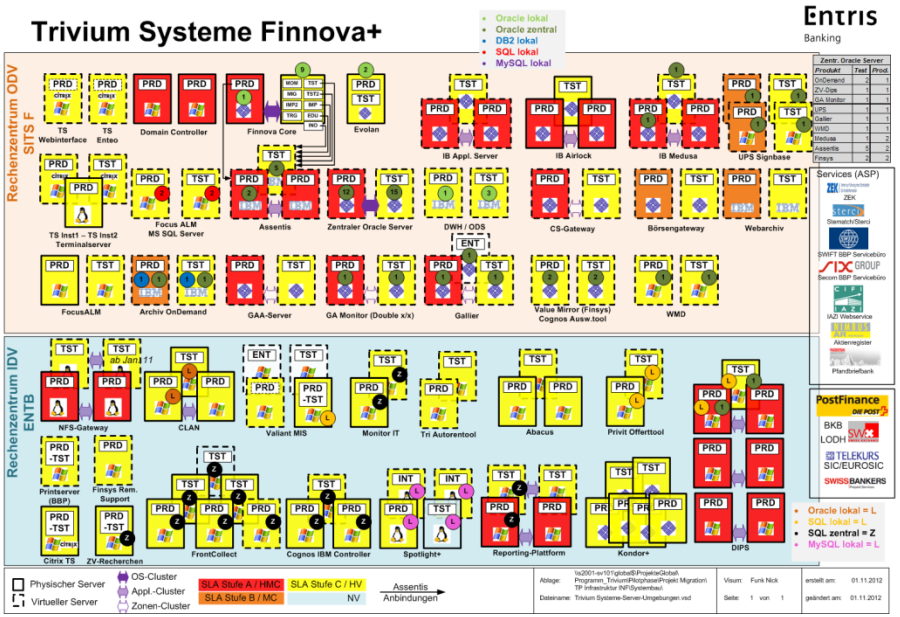

IHRE FRAGEN

Besten Dank

Thomas Spahr
Leiter Architektur
Mattenstrasse 8
3076 Gümligen

031 660 16 55
079 668 00 65
thomas.spahr@entris-banking.ch

FOLIEN RESERVE

Entris
Banking
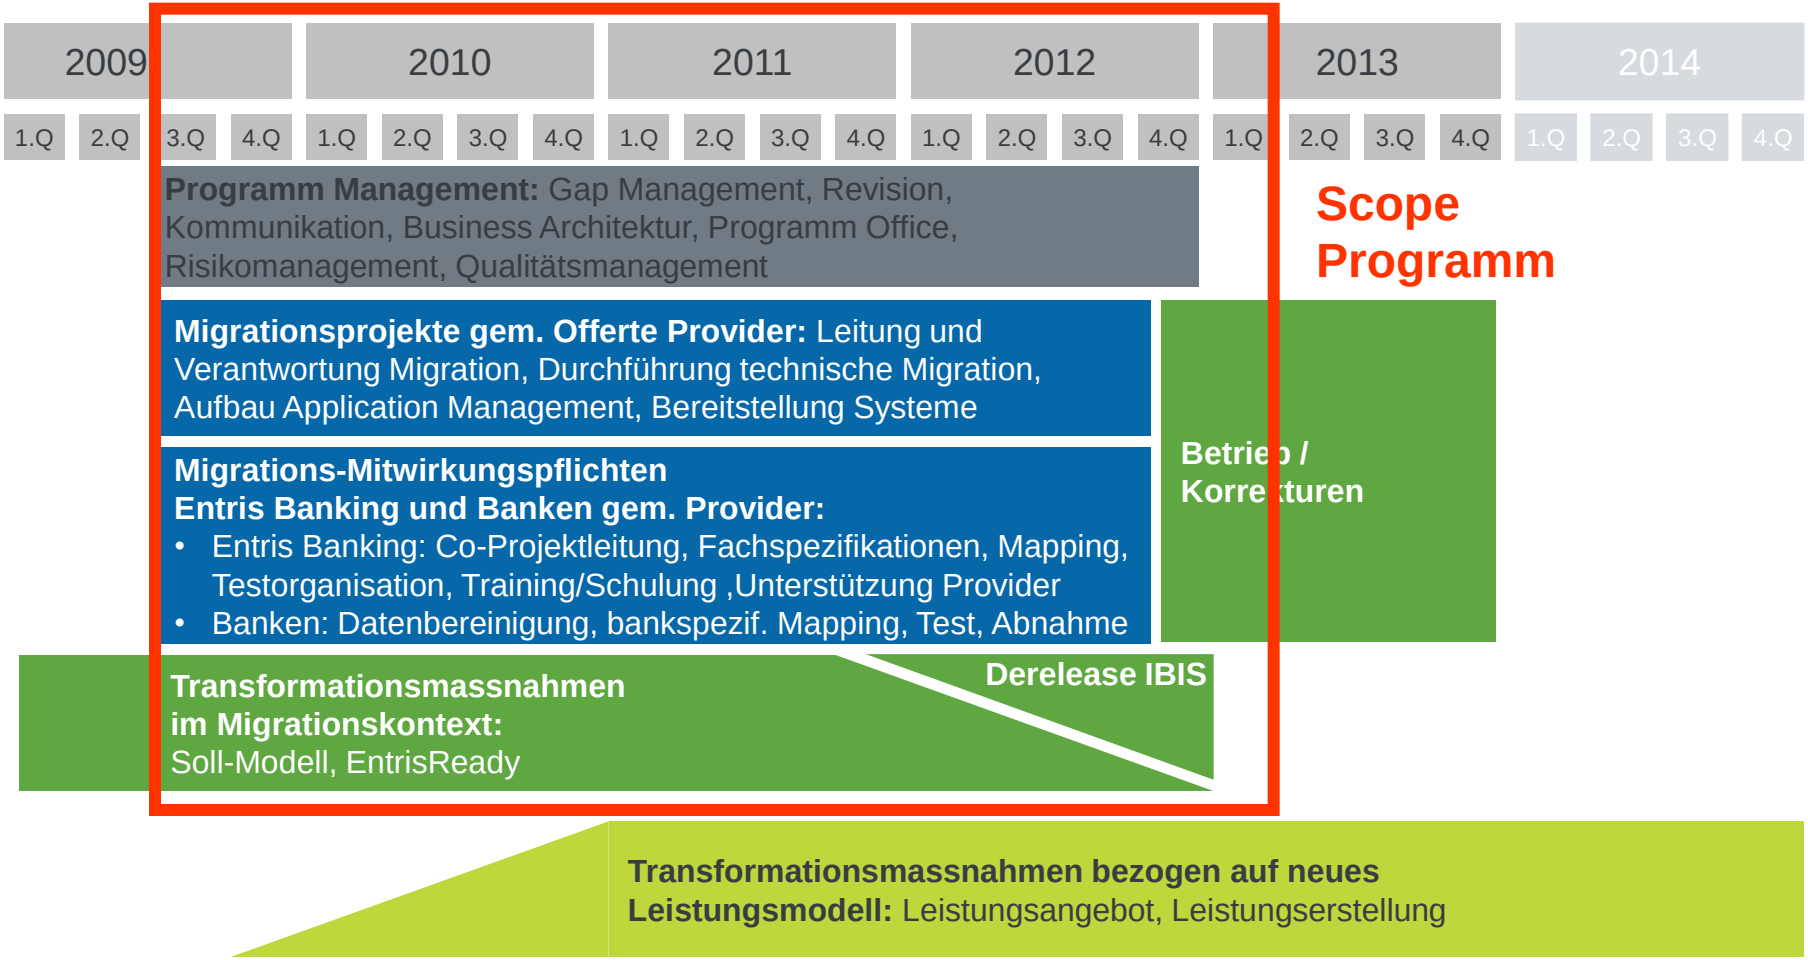
SCOPE INKLUSIVE RANDTHEMEN
